工事名	松山自動車道内子工事		
施工場所	愛媛県喜多郡内子町		
発注者	西日本高速道路㈱　四国支社	工期	2025年8月～2025年11月
工種	仮桟橋組立（プレガーダー架設含む）	使用機械	150ｔCC
工法	パラミックス工法・ノバルハンマー工法・スパイダー工法		
工事概要	幅員：8.0～19.0m（覆工面積：1,000㎡）　延長：70.0m		
	杭長：9.0～21.5m　杭本数：29本（Φ558.8）		

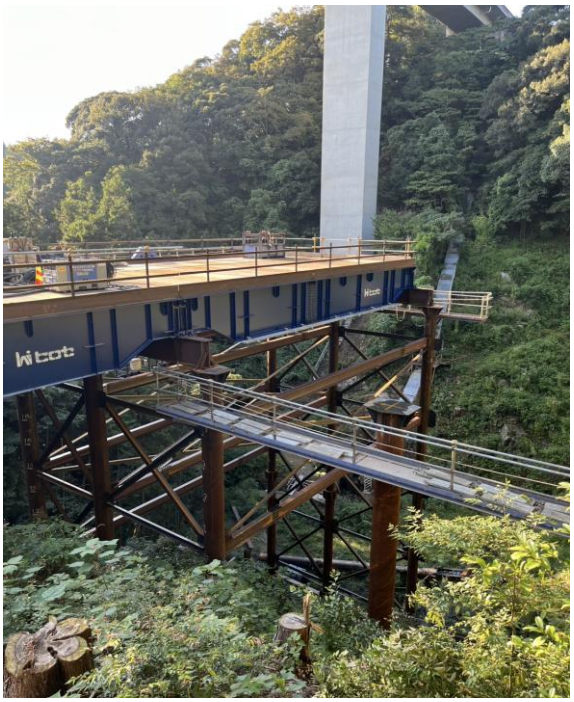

日本ジュウキケンセツ 株式会社
〒769-0104　香川県高松市国分寺町新名1764-1
TEL:087-874-5128　FAX:087-874-7353
